


KRUMM — Handoff de Lanzamiento + Plan de Hitos

Piloto B2B controlado (~primera semana nov 2026) · Repo **test-mpfl** · Ruta producto **/postulaciones-demo** · Fecha handoff 2026-08-25

Estado de partida: **R-0** → **R-6d completadas** (405 tests, build/audit limpios) · Sin backend real; HR dashboard sintético · Claims **descriptive_only / humanReviewOnly**

Roadmap visual — fases M0–M6 + G/T/P1/P2

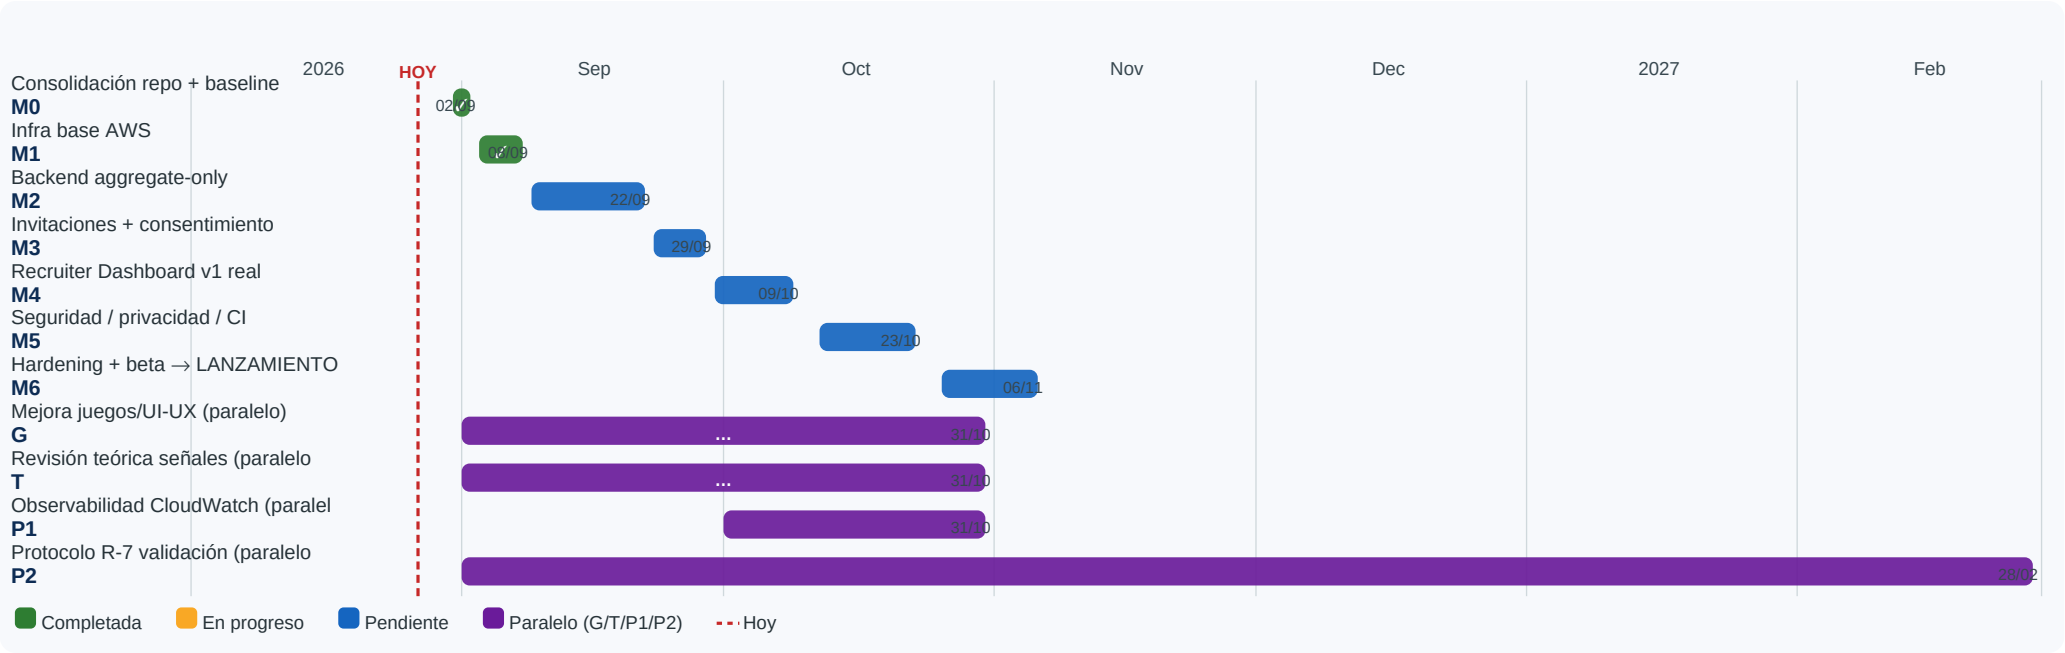

Resumen de fases

Fase	Nombre	Duración	Fechas aprox.	Estado
M0	Consolidación repo + baseline	2–3 días	31 ago – 2 sep	✓ Completada (26/08)
M1	Infra base AWS (S3+CloudFront+IAM+Billing)	3–4 días	3 – 8 sep	✓ Completada (27/08)
M2	Backend aggregate-only	2 sem	9 – 22 sep	Pendiente (checklist listo)
M3	Invitaciones + consentimiento	1 sem	23 – 29 sep	Pendiente
M4	Recruiter Dashboard v1 real	1–1.5 sem	30 sep – 9 oct	Pendiente
M5	Seguridad / privacidad / CI guards	1.5–2 sem	12 – 23 oct	Pendiente
M6	Hardening + beta → LANZAMIENTO	1 sem	26–30 oct (~3–6 nov)	Pendiente
G	Mejora juegos/UI-UX (paralelo)	4–5 sem	sep – oct	... En progreso (G.1/G.3/G.6 ✓, oleada W1–W3/W5)

T	Revisión teórica señales (paralelo)	3–4 sem	sep – oct	... En progreso (T.1/T.2 ✓)
P1	Observabilidad CloudWatch (paralelo)	1 sem	oct	Pendiente
P2	Protocolo R-7 validación (paralelo)	3–5 meses	sep 2026 – feb 2027	Pendiente

Regla de orden: G y T deben cerrar antes de M5/M6 (congelar producto para hardening/beta). Si compiten por tiempo, G prioriza UX del flujo candidato; T prioriza calidad de señal local.

Estado actual por fase (evidencia real)

Fase	Estado y evidencia
M0 ✓	Consolidada en aef0806 ; binarios AWS fuera de tracking (3382fae). Gates: 405/405 tests, build OK, audit 0 vuln, smoke Playwright 5/5. Corregida regresión i18n de <i>c3989de</i> (fallback useLanguage ES-first, UnifiedGameBattery restaurado, TeamCoordination ES-first) + tests desactualizados.
M1 ✓	Cerrada 27/08: frontend staging (S3 privado + OAC + CloudFront, headers CSP/HSTS, SPA rewrite, byte-ídem , gates navegador desktop+móvil) + IAM mín. privilegio (rol <i>krumm-staging-frontend-deploy</i> scoped S3+CloudFront staging; permission set + assignment SUCCEEDED; e2e SSO→rol reservado→assume-role con controles +/-) + presupuesto \$25/mes con alarmas 80%/100% (SNS→email). Runbook idempotente: scripts/m1-iam-billing-deploy.sh . Único item abierto: Route53/ACM (dominio propio).
G ...	G.1 ✓ (audit UX: 18 hallazgos P01–P08 + L01–L08). G.3 ✓ y G.6 ✓ — oleada de calidad W1–W3/W5 (27/08): temas por juego (Láser "Órbita", Globo "Cielo", Rutas "Urbano", Faro pulido) + <i>GamePips</i> + botones unificados KRUMM (W1); animaciones CSS con <i>prefers-reduced-motion</i> : haz pulsante, overlays nivel + intersticios, tensión/burst globo, token animado, entradas Faro, SFX WebAudio default-OFF con toggle (W2); micro-instrucciones animadas ≤15s <i>GameMicroIntro</i> sin telemetría previa (W3); jerarquía score-vs-caveat en reporte (W5). G.2 ... (copy L01/L04 + micro-intros + pips; pendiente práctica sin puntaje) · G.4 ... (pacing Láser con overlays/intersticios; mecánicas intactas) · G.5 ... (touch targets cerrados; pendiente teclado/breakpoints/foco). Decisiones usuario 27/08: L02 copy-only, L06 2 pasos, P08 BehindPanel se mantiene. Gates: 436/436, oxlint 0, build OK, audit 0, smoke desktop+móvil 0 errores/0 overflow.
T ...	T.1 ✓ (matriz trazabilidad v2 — 2.º intento subagente 27/08): §10 en <i>docs/research/krumm-talent-game-behavior-mapping-technical-study.md</i> (285→581 líneas) — 66 métricas clasificadas (3 directa / 22 adyacente / 14 ambigua-no resuelta / 27 interna), 7 citas "verificación pendiente" explícitas, ninguna métrica facial "directa". T.2 ✓ (audit sync local: 7 paths P1–P7, sin bugs activos; 6 tests regresión GREEN). T.3 (sanity cámara real) / T.4 (alimentado por las 14 filas "ambigua" de §10, incl. tensión leadership/communication Faro) / T.5 / T.6 pendientes.
M2–M6, P1, P2	Pendientes. M2 checklist de entrada listo: reusa <i>src/assessment/finalAssessmentPayload.js</i> (validación server-side, verificado) + infra M1 activa (rol deploy, presupuesto). M4 conecta HR dashboard (hoy sintético) a sesiones reales, read-only, reglas null≠0. M5 añade CI privacy guard (scan-forbidden-keys) y ZAP 0 critical/high.

Contratos inmutables y privacidad (no negociables)

- Baterías: **stable_dg** default/fallback intocable; original vía **?battery=original**; fixtures **?fixture=1[&battery;=original]**.
- Contratos de telemetría intactos: `game_event_v1`, `stimulus_shown/response/game_end`, `gameCorrelation.aggregate`, `assessment_feature_vector_v2`, `allowlist` agregados por juego.
- Privacidad: nunca persistir `video/frames/landmarks/keypoints/pointer samples/rutas` reconstructivas/raw events.
- Señal ausente = desconocida/caveated, **nunca** desempeño bajo. Leadership/comunicación = `not_measured` (score: null). Adaptabilidad = `insufficient`. Claims `descriptive_only` hasta R-7 validado.
- Flags de gobernanza: `humanReviewOnly` / `noAutomatedDecision` / `observationalOnly` / `privacySafe` siempre presentes.

Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
G/T se extienden más allá de oct	Congelar con lo que esté; lo no cerrado → backlog post-lanzamiento. M5/M6 no esperan.
Legal/DPO demora firma DPIA	Lanzar piloto bajo consentimiento explícito reforzado + retención corta; DPIA firmada antes de escalar.
SES sigue en sandbox	Invitaciones manuales por email propio durante beta; SES solo acelera escala.
Desincronización de señales (T.2)	T.2 cerrado 27/08: sin desincronización activa (6 tests de regresión); P7 (contrato quality) monitorizado.
Cambios G alteran métricas de juego	Regla dura: agregados <code>allowlist</code> inmutables; si una mecánica cambia una métrica, versionar feature vector + fixtures.

AWS free tier — mapeo por fase

Evitar hasta Fase F: RDS, ECS/K8s, WAF (opcional), ELB.

Comandos de gates (fijos)

```
NODE_ENV=test npx vitest run <focales> --pool=threads --reporter=default
NODE_ENV=test npx vitest run --pool=threads --reporter=default # suite completa
npx oxlint src/postulation-demo src/tasks src/main.jsx src/assessment src/telemetry/gameCorrelation.js
npm run build
npm audit --audit-level=high --omit=dev
git diff --check
# Smoke dev (nunca NODE_ENV=production con Vite):
NODE_ENV=development npx vite --host 127.0.0.1 --port 5173
```

Fuente: docs/plans/2026-08-25-launch-handoff.md + docs/plans/2026-08-25-launch-milestones-plan.md · Generado con reportlab.
