

Arquitectura actual y plan de cierre: de inputs del postulante al dashboard de RR.HH.

Diagrama mejorado del estado real de [/postulaciones-demo](#) . Distingue inferencia local en navegador, inferencia/LLM de servidor como etapa futura, reporte local actual, dashboard HR pendiente y sprint/Kanban/Gantt para completar el MVP hacia piloto.


Repo: [test-mpfl](#)

Estado base: [Dv2](#)

No incluye commit/push

KRUMM PRODUCT DATA FLOW: LOCAL INFERENCE NOW → SERVER INFERENCE + HR DASHBOARD NEXT

El flujo actual termina en reportes locales para revisión humana. El servidor/LLM y dashboard HR están modelados como próximos bloques, no como capacidades ya productivas.

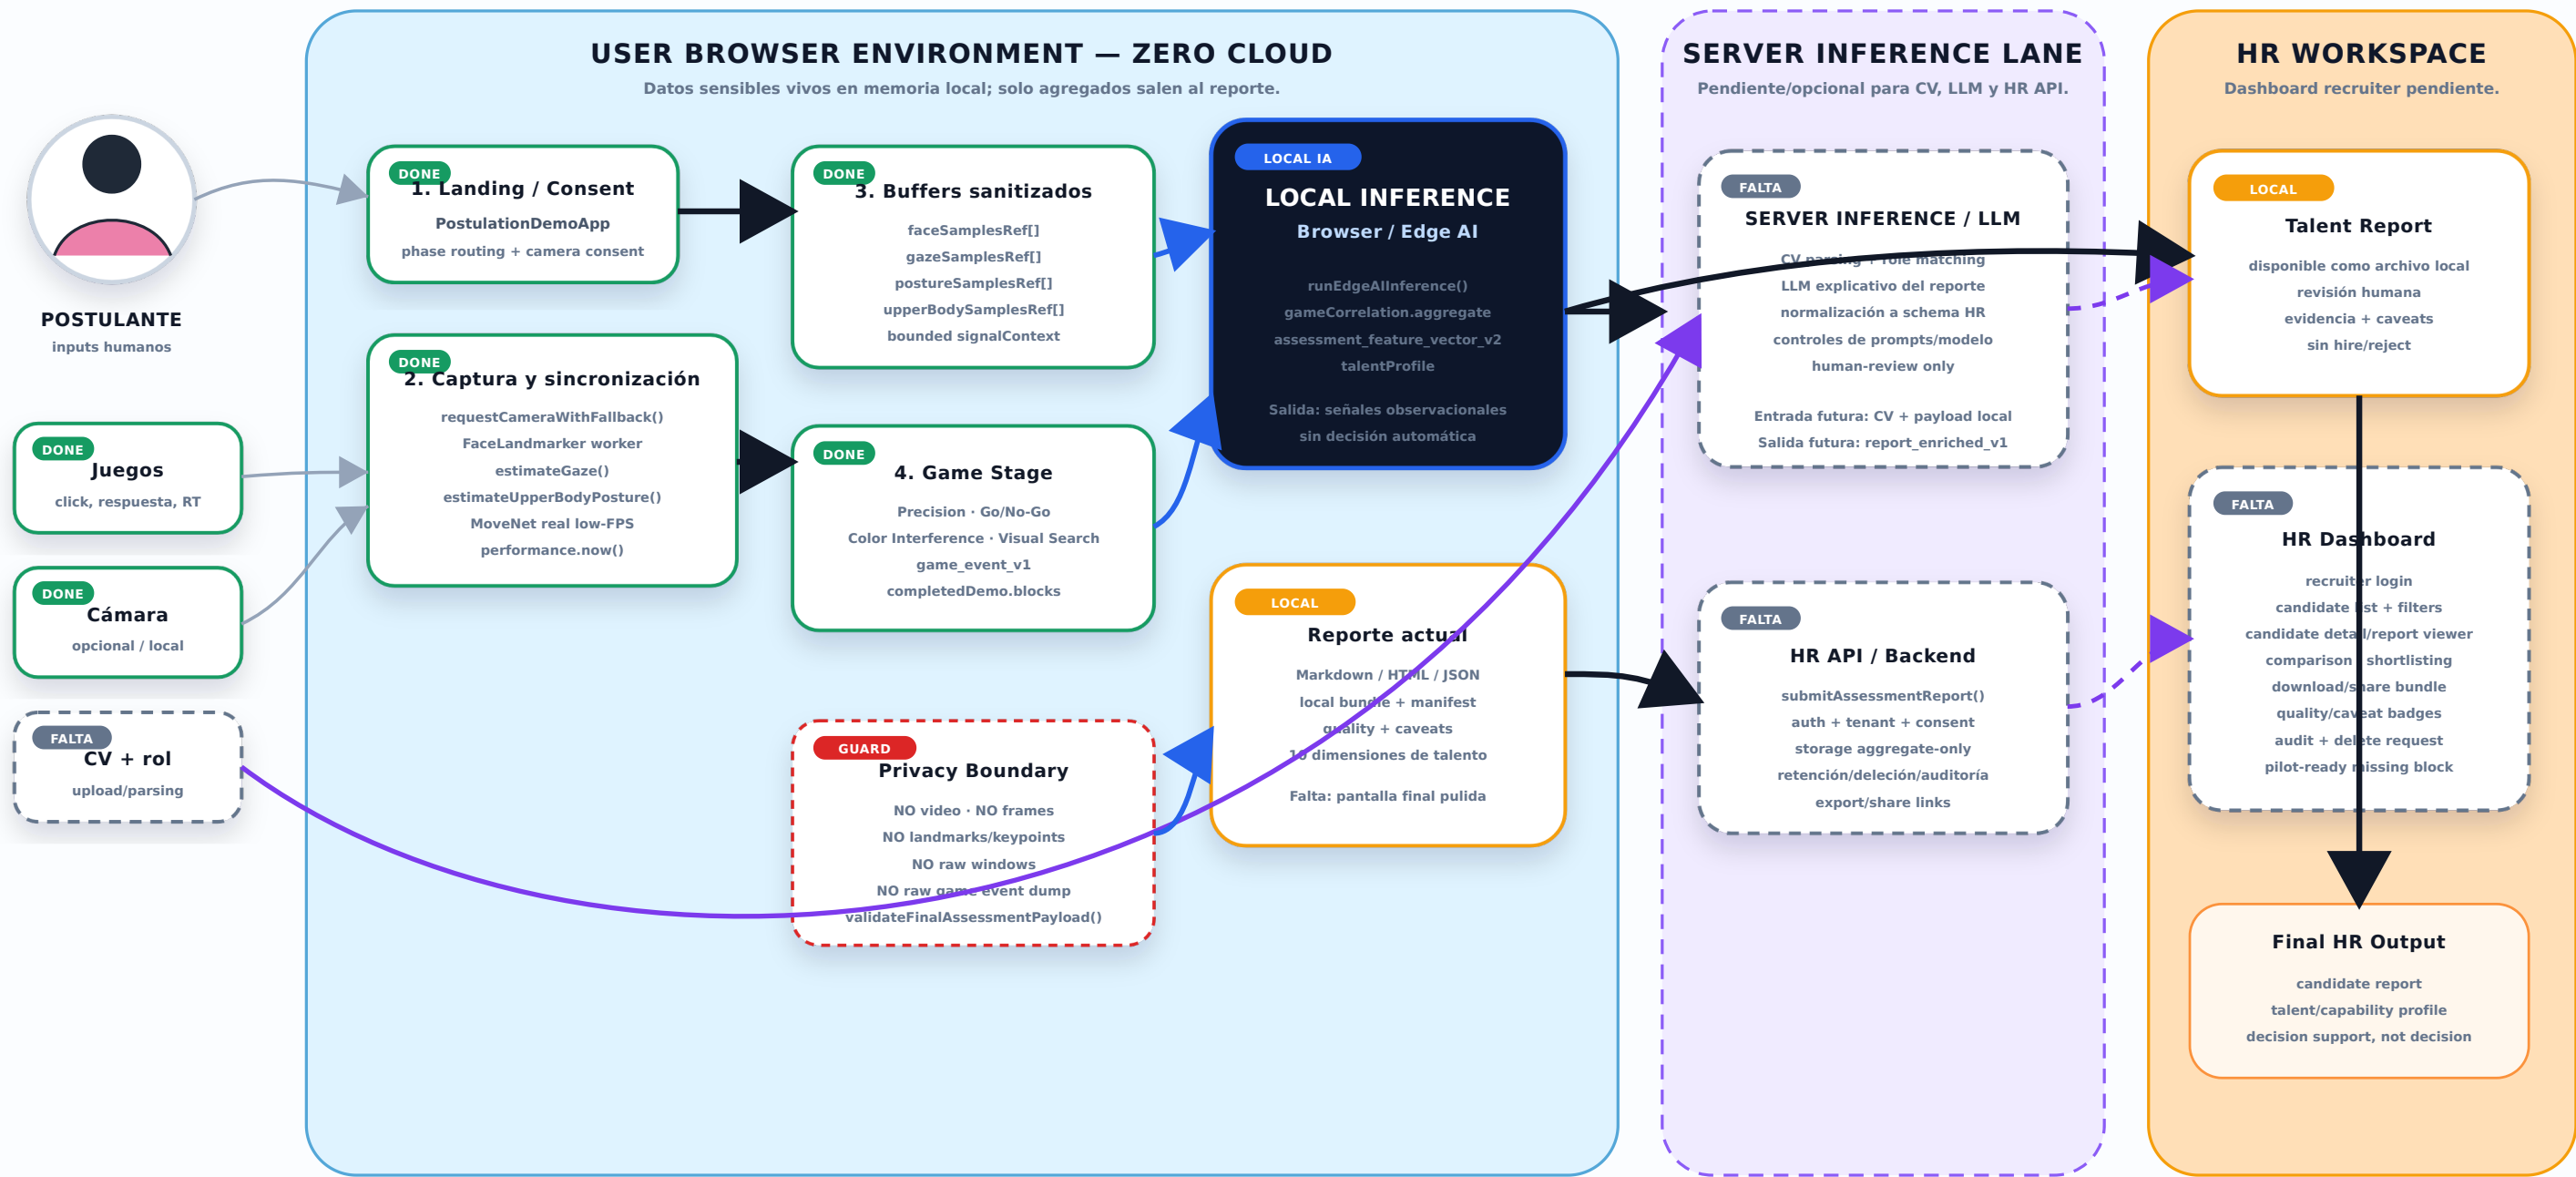

Estado de arquitectura

Ahora: inferencia local completa en navegador para reporte agregado. Próximo: pantalla final, descargas y fixture. Futuro HR: inferencia servidor/LLM con CV, API, persistencia aggregate-only y dashboard recruiter.

Regla no negociable: mantener privacy-safe estricto y lenguaje de revisión humana; no automatizar decisiones de contratación.

● Implementado/probado

● Funciona local; falta UX

● Siguiendo sprint

● Pendiente

● Guardar privacidad

● Futuro/opcional

Inputs, variables intermedias y salidas

Bloque	Input / variable	Estado	Salida / uso
Postulante	Clicks, respuestas, RT, score, outcome	HECHO	<code>game_event_v1</code> , resumen por juego y <code>completedDemo.blocks</code> .
Postulante	Cámara local opcional	HECHO	<code>MediaStream</code> transitorio; no persiste video/frames.
Postulante	CV, rol objetivo, metadata candidato	FALTA	Debe alimentar CV parser + server inference sin mezclar datos crudos con reporte local.
Captura facial	MediaPipe blendshapes + quality	HECHO	<code>faceSamplesRef[]</code> sanitizado; AUs/FACS para inferencia local.
Gaze/postura	Landmarks transitorios	HECHO	<code>gazeSamplesRef[]</code> , <code>postureSamplesRef[]</code> ; landmarks no salen.
MoveNet	Keypoints transitorios	HECHO	<code>upperBodySamplesRef[]</code> ; keypoints removidos, sin fallback geométrico falso.
Inferencia local	face + gaze + posture + upperBody + game	DV2	<code>runEdgeAIInference()</code> , <code>gameCorrelation.aggregate</code> , <code>assessment_feature_vector_v2</code> .
Sesión	Battery blocks + telemetry + Edge AI	HECHO	<code>krumm_unified_assessment_session_v1</code> con governance y privacy validation.
Perfil	assessmentSession	HECHO	<code>krumm_talent_profile_v1</code> : 10 dimensiones observacionales.
Reporte local	finalPayload + talentProfile	LOCAL	Markdown/HTML/JSON + bundle local; falta pantalla y descargas productizadas.
Inferencia servidor	CV + payload local agregado	FALTA	LLM explicativo/enriquecimiento; debe ser opcional y con permisos/retención.
Dashboard HR	Reportes agregados persistidos	FALTA	Login recruiter, lista candidatos, filtros, detalle, comparación, descarga, auditoría.

Lectura del estado actual

TRABAJADO Y TERMINADO

- Ruta separada `/postulaciones-demo` , landing, setup, stage de juegos y reporte local.
- Señales locales en segundo plano y Dv2: correlación agregada + vector v2.
- Inferencia local explícita en navegador con Edge AI v9.1 cuando hay señal suficiente.
- Validación privacy-safe y artefactos finales sin muestras crudas/reconstructivas.

EN TRABAJO INMEDIATO

- Reporte final productizado: pantalla bonita, cards, descargas y drawer técnico.
- HUD detrás de escena con explicación visual de inferencia local.
- Fixture sintético para demo estable sin cámara/juegos completos.

FALTA PARA COMPLETAR PRODUCTO HR

- CV/rol + inferencia servidor/LLM opcional.
- Backend/API con almacenamiento aggregate-only, auth, auditoría y borrado.
- Dashboard recruiter para acceder, filtrar, comparar y descargar resultados.
- QA multi-dispositivo, legal/privacy/security y validación piloto.

Sprint / carta Gantt / Kanban de tareas restantes

Bloque	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
0. Base Dv2	hecho											
1. Report UX + descargas	Fase F	descargas										
2. HUD/drawer + fixture		HUD	fixture	QA visual								
3. CV + server inference design			CV schema	parser	LLM PoC							
4. HR Dashboard frontend					wireframes	list/detail	viewer					
5. Backend/API/storage						contract	API	auth	audit			
6. Pilot hardening								security	privacy	device QA	pilot	docs

Kanban de cierre MVP

Done / base

CERRADO

Dv2 route-specific

Correlation aggregate, feature vector v2, local Edge AI, privacy scan.

Candidate stage

Landing, setup, games, HUD básico y preview de reporte.

Backlog priorizado

S3-S8

Fixture sintético

?fixture=1 para demo estable con datos etiquetados.

CV/rol schema

Upload, parsing, alias/role target, sin mezclar raw con reporte.

HR dashboard

Login, candidate list, detail/report viewer, filters, comparison.

Backend/API

Submit, persistence aggregate-only, tenant/auth, audit, deletion.

Next sprint

S1-S2

PostulationReportScreen

Summary cards, skill profile, game results, caveats, governance.

Download bundle UX

Botones de Markdown/HTML/JSON/manifest, validación y tests.

Behind-the-scenes drawer

Explicar inferencia local, señales disponibles y límites privacy-safe.

Hardening/piloto

S8-S12

Security/privacy review

Threat model, retention policy, DPIA/consent copy.

Device/browser matrix

Chrome/Edge, cámaras múltiples, low-light, laptop 1366×768.

Pilot protocol

Manual smoke, rubric, support, validation and caveat language.

Plan recomendado replanteado

1. Cerrar experiencia local end-to-end

Implementar Fase F: reporte final visual, descargas y drawer. Esto convierte lo ya probado en una demo mostrable.

3. Diseñar contrato HR antes de backend

Definir JSON/API, permisos, retención y borrado. No construir dashboard sin contrato de datos estable.

5. Construir dashboard recruiter MVP

Lista de candidatos, detalle, reporte, filtros, descargas, caveats y governance visible. Sin ranking automático.

2. Asegurar demo confiable

Fixture sintético, QA visual, smoke manual con/sin cámara, runbook. Objetivo: no depender de condiciones de sala.

4. Añadir CV/rol como módulo aislado

Primero schema + parsing local/fake, luego LLM server opcional. Mantener separación entre evidencia conductual y CV.

6. Endurecer para piloto

Seguridad, privacy/legal, device/browser QA, protocolo piloto y validación psicométrica inicial.

Orden recomendado: no saltar directo al servidor/LLM. Primero hacer excelente el reporte local y la demo reproducible; luego diseñar contrato HR; recién después implementar backend/dashboard.
